



Réunion livrable jalon 1

Site Internet et BDD métier **ATMO BFC**

... des 3 jalons

1

LIVRAISON DU SITE WEB **version alpha**

19/12/2023

- ✓ 1.1 : Initialisation du projet et infrastructure
- ✓ 1.2 : Réalisation du site Web
- ✓ 1.3 : Administration partielle des contenus
- ✓ 1.4 : Inventaire des différentes sources de données
- ⚙ 1.5 : Création de la BDD (en cours)
- ▾ 1.6 : Spécifications des services (déplacer en 2)

2

LIVRAISON DU SITE WEB ET BDD métiers **version beta**

- 2.1 : Édition des contenus du site
- 2.2 : Collecte des données dans la BDD
- 2.3 : Mise en place des services
- 2.4 : Utilisation des services sur le site

3

LIVRAISON DU SITE WEB ET BDD métiers **version 1.0**

- 3.1 : Recette client (corrections et validations)
- 3.2 : Vérification des contenus éditoriaux et données
- 3.3 : Ouverture public du site et de la base de données
- 3.4 : Démarrage de la maintenance et support technique

1 / Présentation Site CMS - *version alpha*

- Accueil + pages annexes responsive
- Principe de navigation sur Air
- Pages avec données : carte, consulter les données

2 / État d'avancement BDD / Données SIG

3 / Plan de gestion

- Jalon 1 : Récapitulatifs des temps passés
- Jalon 2 : Mars 2024
- Jalon 3 : Mai-Juin 2024

4 / Rétroplanning





Jalon 1 : Décembre 2023

★ Objectifs

T2 - Base de données métier

-  Création de la BDD métier et son remplissage partiel


Trois sources différentes seront traitées :

1.  Données temps réelles, mesures, stations,
2.  Données issues d'OPTEER, **En cours**
3. Données issues de Batisph'air (JURAD-BAT)

Pour chaque source :

1. identifier la source (base, service web, url, ...)
2. lister les données à récupérer dans cette source
3. comment la récupérer (données brutes)
4. quels types d'opérations à réaliser pour l'intégrer dans la BDD métier

Nous n'utilisons pas un modèle générique mais un modèle spécifique en fonction du type de source. En parallèle, une réflexion est apportée sur la mise à jour de ces données - préparation de scripts (automatiser la MAJ selon une périodicité par ex)

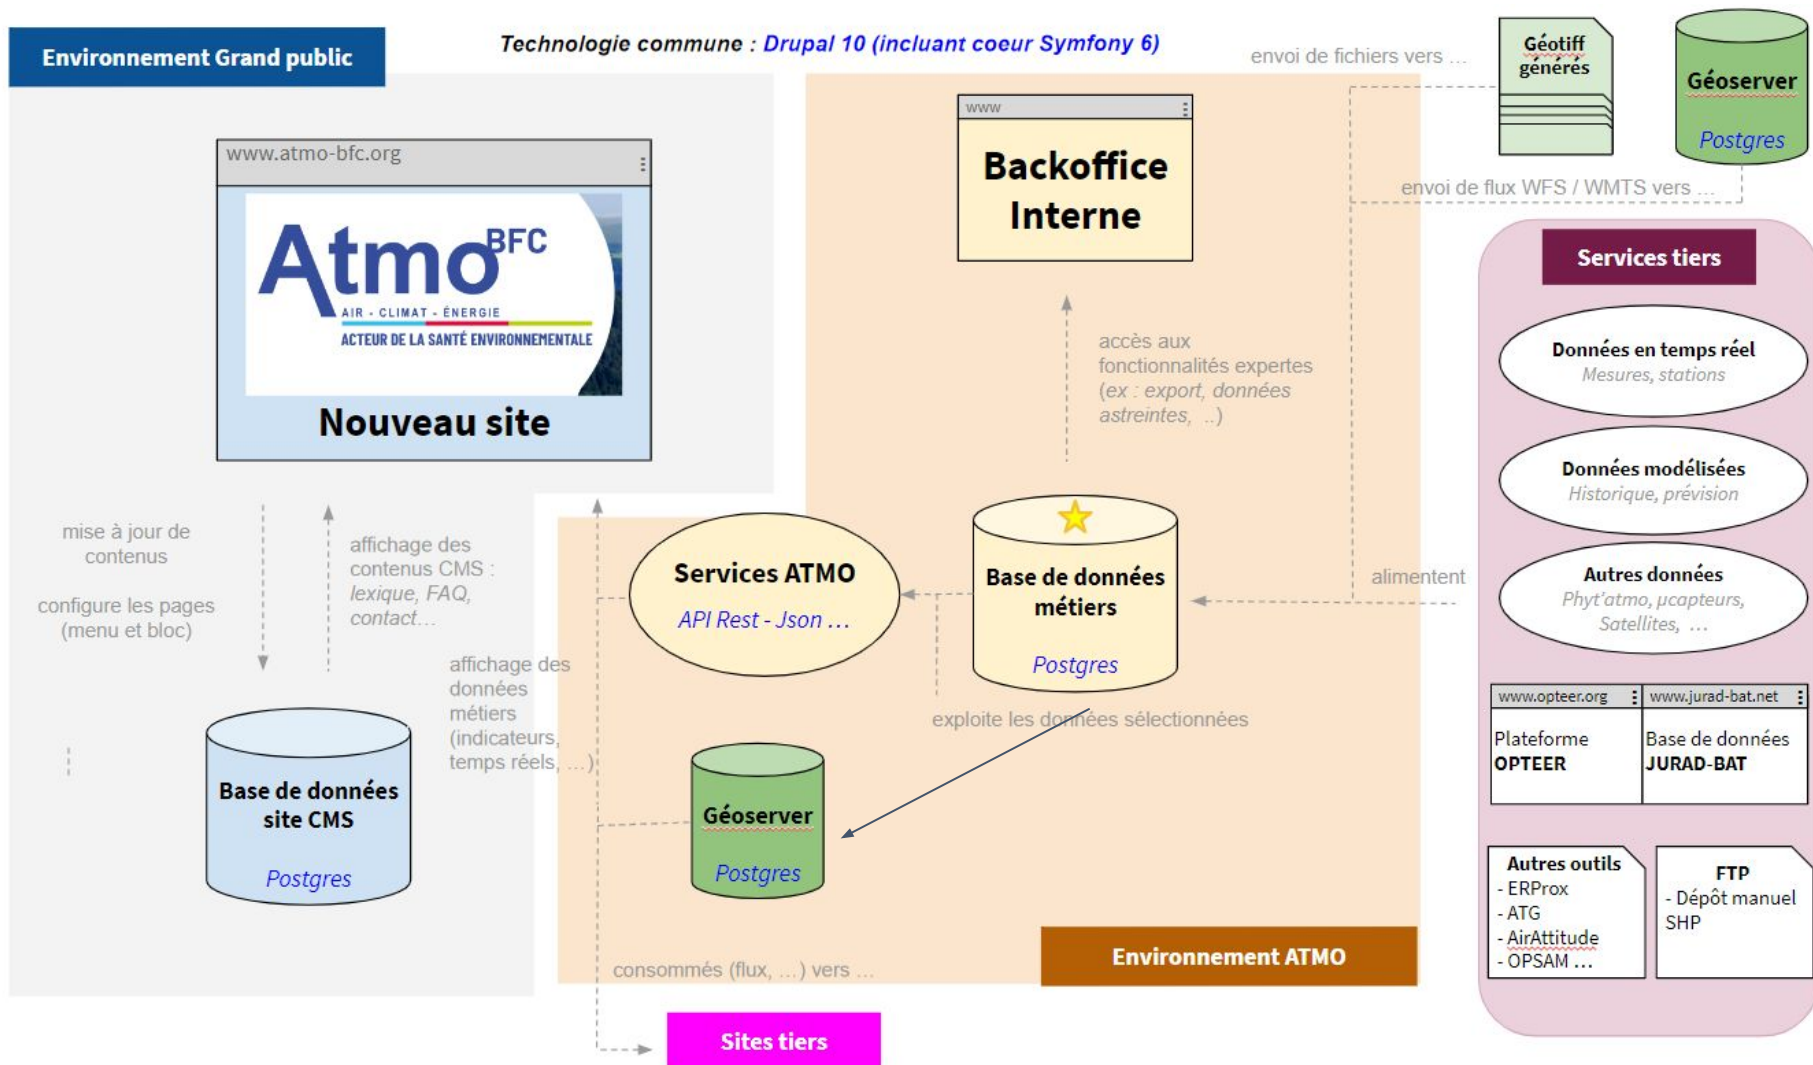




Jalon 1 : Récapitulatif des temps passés


Temps consommés 

Temps dispo 


T1 - Site Internet
25 jours

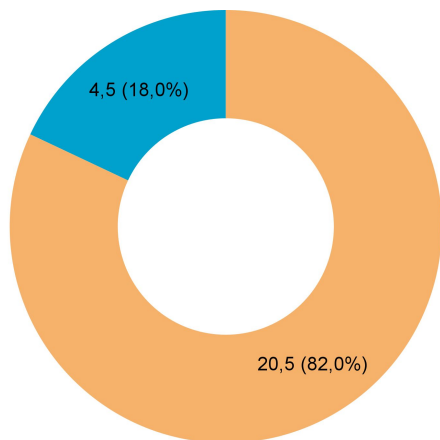


T2 - Base de données métier
30 jours

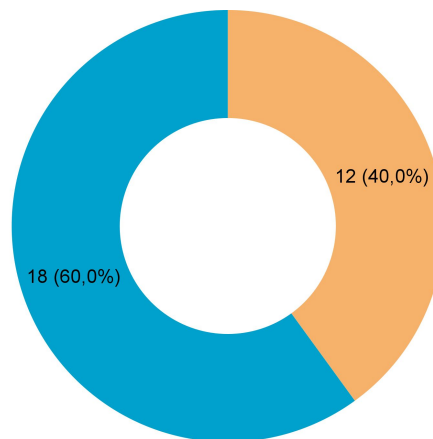


T3 - Services
95 jours

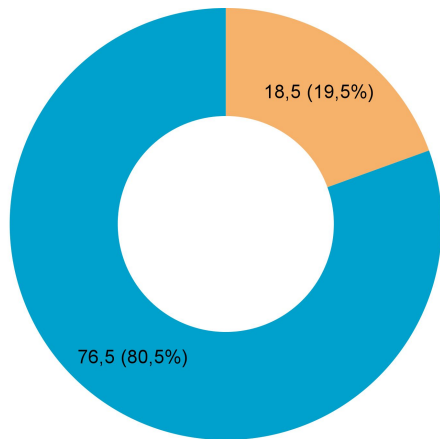

Suivi de projet
20 jours

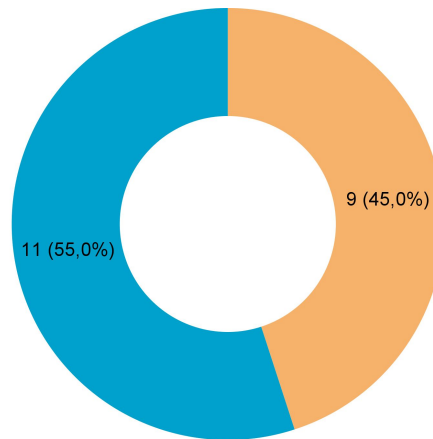

TOTAL
170 jours

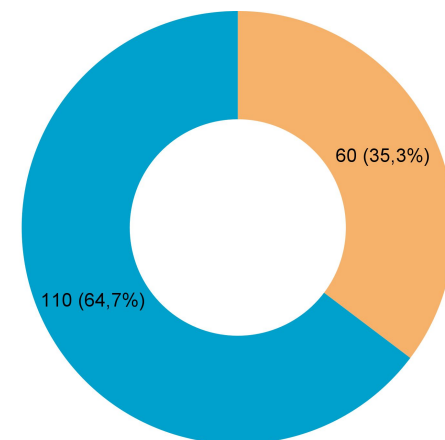

Jalon 2 : Mars 2024

Durée : 3 mois



Réunion Jalon 2 : 2ème quinzaine mars 2024

★ Objectifs

T1 - Site Internet

- Poursuite de l'intégration des contenus CMS/ éditoriale
- Exposer et lire les services depuis le site

T2 - Base de données métier

- Poursuite de la création de la BDD métier et remplissage
 - Intégration données OPTTEER,
 - Exploitation du flux indices pollens et alertes pollens

T3 - Services (lister les services qu'ils serait possible d'embarquer pour ce jalon)

- Études, spécifications, maquettes des différents services
- Écrire les méthodes de service (API)
- Réalisation des interfaces.

Jalon 3 : Mai-Juin 2024

Durée : 2-3 mois



Réunion Jalon 3 : fin mai - début juin 2024

★ Objectifs

Phase de recette pour stabiliser le site en vue d'une ouverture grand public.

- Traitement des tickets réceptionnés - correctifs sur T1, T2, T3,
- Optimisations (performance, qualité, sécurité, ...) sur T1, T2, T3,
- Fourniture des documentations techniques.

T1 - Site Internet

- Accompagnement, prise en main des *backoffices* (CMS + BDD métier)
- Relecture des contenus par ATMO BFC

T2 - Base de données métier

- Vérification des données brutes

T3 - Services

- Sorties API : vérification des données exposées

🚩 Livrable

- ✨ Version production du Site CMS et BDD métier - *version 1.0*

Réunion livrable jalon 1 19/12/2023

